



Consiliul Județean Harghita  
Harghita Megye Tanácsa

**HMTJ/ (2013/12/23)**

**Ikt.Sz.:**

## **JELENTÉS**

### **Országos Településfejlesztési Program (PNDL) Harghita megyében 2013 - kiegészített**

---

Előterjesztő: Elnöki kabinet és Menedzsment vezérigazgatóság Feladatkövető részlege

---

**Referenciadokumentum:**

A rendelkezésre álló, SEAP honlapon közzétett kimutatók.

A minisztérium által küldött átiratok

A témában folytatott levelezések

A szakigazgatóságok által összeállított kimutatók

A megyei tanács által elfogadott tanácshatározatok

## I. Felvezető

A Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium által koordinált Országos Településfejlesztési Program (PNDL) helyi, illetve regionális fejlesztéseknek nyújt keretet, ami az helyi infrastrukturális munkálatokat illeti.

A programot a 28/2013-as Sürgősségi Kormányrendelettel fogadták el, míg a metodológiai normákat az 1851/2013-as rendelettel szabályozza a Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium.

Az idei évben e program keretén belül utas beruházásokra, vízvezeték és csatornarendszerek fejlesztésére, illetve kiépítésére igényelhetek támogatást a helyi tanácsok.

## II. Fontosabb megállapítások/ Kronológiai áttekintés:

**2013 április 20** – megyei tanácselnök levele a Hargita megyei Egyeztető Tanács (HET) tagjainak: PNDL ügyében pontosítás – Figyelembe véve, hogy az utolsó héten többen kérték tőlem a PNDL megyei, vagy térségi prioritás listát és esetenként válaszoltam mindenkinek, szeretném ha az álláspontomat azok is megismernék akik nem kérdeztek! Ugyanakkor várom az építő jellegű javaslatokat és meglátásokat.

2013 március 14.-ei UNCJR gyűlésen elhangzottak alapján: „van 450 millió lej országos szinten erre a programra. Hargita megyében várható 11-13 millió lej. Új munkálatról nem lehet szó, csak megkezdettől.”

Addig NEM csináltunk listát (legalábbis a tudtommal, NEM!), hogy a sok változó, tisztázatlan dolog miatt feleslegesen ne induljunk el. Erre a hét folyamán, fog sor kerülni, ha tisztázódnak a fenti kérdések.

Tehát várom a javaslatokat és észrevételeket, írásban, hétfőn délig!

Az alapján el fogunk készíteni egy 20 milliós prioritási listát és ezt küldjük el Borbély László politikai alelnöknek, hogy a héten tartandó tárgyalásokon, hátha lehetőség lesz még plusz pénzt szerezni Hargita megyének.

**2013 április 24** – megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnök és Orbán Béla vezérigazgatónak: „megvan hogy fogjak osztani a pénzt a PNDL-re. Kérlek ma ezzel is foglalkozzanak a kollégák! várom mi a javaslat?”

**2013 június 17** - Petres Sándor alelnök kéri, hogy a Beruházási vezérigazgatóság munkatársai ellenőrizzék le a minisztérium honlapjára feltöltött listát, hogy szerepel-e mind a 32 munkálat amelyet a megyei tanács javaslatként előterjesztett. Fekete László kolléga letöltötte a minisztérium honlapjáról a PNDL program keretében 2013-ban támogatott beruházások listáját. A listán szerepel mind a 32 munkálat, a minisztérium és az érdekelt önkormányzatok között megkötött támogatósi szerződésben szereplő összegekkel. (477-508 sorszámú munkálatok a mellékelt országos listán)

**2013.06.20** – Petres Sándor alelnök a megyei tanács RMDSZ frakciójával tartott gyűlésen a következőkről számolt be a PNDL programmal kapcsolatban: Az idén az egész programra 9.048.000 lejt adtak Hargita megyének. Semmi új munkálat nem lehet a listán. Kritérium, hogy ami befejezhető, az fejeződjön be. Elkészítettünk a HET-el egy 20 milliós javaslatot, de aztán szóltak, hogy 9 millióra csökkentjük le. Szerencsére bementünk Bukarestbe, mert ők ott már nélkülünk elosztották...így sikerült mi is beleszóljunk megyei utaknál – a bélbori út 1 millióval, a derzsi út 1,35 millióval és a 128-as orotvai út 100.000 lejjel került így be.

**2013 augusztus 28** Borboly Csaba megyei tanácselnököt telefonon értesíti Iuliu Matache fejlesztési államtitkár hogy a szeptemberben (legkésőbb októberben!) esedékes költségvetés kiegészítéskor esélyünk van arra, hogy el fogják venni a betervezett PNDL pénzeket, a jelentős alulköltés miatt, Hargita megyétől! Az államtitkár szerint Hargita megye az egyedüli, amelyik ennyire alulteljesített!

**2013 augusztus 28** A megyei tanácselnök kéri Petres Sándor alelnököt, hogy a Beruházási vezérigazgatóság készítsen szeptember 2.-ig egy átcsoportosítási javaslatot, figyelve arra, hogy csak olyan javaslatok kerüljenek be, amelyek esetében már :

- ki van szerződve a tervezés és elkészült az érvényes terv, ellenőriztetve, stb.
- a kivitelezésre is van érvényes szerződés, sőt ha lehet már folyamatában van a munkálat
- a munkafelügyeletre (diriginte) is megvan a a közbeszerési eljárás és tudnak dolgozni.

**2013 augusztus 29** Kiegészítés a megyei tanácselnök részéről az összes címzett felé: A 3 feltétel mellett kérem figyelembe venni azt az alapkövetelményt: ne új beruházás legyen!

**2013 augusztus 30** A Beruházási vezérigazgatóság illetékes munkatársa elküldte a kért helyzetjelentést. A tanácselnök elvárása, hogy egy külön oszlopban legyen „hogy nem tudják vállalni a felelősséget, hogy október 30-ig elköltésre kerül!”. Kiegészítve újraküldték, a feladat ezzel megoldottá lett nyilvánítva.

**2013 augusztus 29** Petres Sándor alelnök levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Sikeresen felbolondult az egész megye, anélkül, hogy alapos elemzés lett volna az akció előtt. Nálunk épp zajlott/zajlik a hónap végi összesítés, illetve a héten levelet írtunk minden érintettnek, aki nem haladt, kérve „grafic de executie”-t.

**2013 augusztus 29** Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: azt nem tudom elfogadni, hogy – ha igaz – olyan javaslatok vannak benyújtva, amelyeket nem lehet kora ősszel elszámolni, illetve a pénzt elviszük, elveszik a megyéből. Azt se, hogy még egyszer november-decemberben aszfaltozzunk pl. a 133-as úton azért, mert nincs érvényes terv (és az utat persze javasoltuk, anélkül, hogy előtte a tervet rendbe tettük volna!)

Érdemi egyeztetés nélkül hoztál döntést, és egyelőre úgy néz ki, nehezen kivitelezhető! (A polgármesterek többsége most szerzett tudomást a listáról, többükkel nem volt egyeztetve).

**2013 augusztus 30** Petres Sándor alelnök levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Volt egy 20 milliós, egyeztetett lista. A polgármesterek is meg voltak kérdezve. Igaz, hogy nem mindenki, mert a 28-as a 7-es, 40-es és 577 összeolvasztása volt. Csak azzal dolgoztunk, ami ezekben szerepelt. Megyei utaknál meg arra koncentráltunk, ami 122j-vel hosszabbítható.

Három megyei út van a listán: 174A Bélbor (gondolom, mindenki ismeri a történetét), 133 Muzsna (122j eset, egy funkcionális szakasz befejezése, az a szakasz, amelyik pénzt is kapott 577-en, és „jézhető” is), illetve 128 Orotva (tavaly kapott 577-en, te ígérted meg az átvételkor a folytatását).

A munkálat megkezdése előtt a 133-on próbáltunk minden lehetséges problémát kizárni. Ekkor jelezte az ISC, hogy amit tavaly még elfogadtak, idén nem fogják, kell egy „Dispozitie de santier” szintű kiegészítés a tervhez. Mivel a tervező cég kimúlt, új tervező kell.

Orotva nem fog menni, az ott szereplő 100.000 lejt újra lehet gondolni.

**2013 augusztus 31** Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: „a 128 as útról kollégáid írták ma le vicc volt a javaslat, a 133-as megyei út esetében jó dolog, hogy "próbáltatok minden lehetséges problémát kizárni" a munkalat megkezdése előtt, viszont úgy gondolom nem ártott volna utánanézni és kiszűrni ezeket a problémákat már a javaslat megtétele előtt, vagy azt követően, hisz már rég lehetne tervünk és dolgozhatna a cég, ha valaki érdemben követné a beruházásainkat és senki se haragudjon meg, de nálam lassan szeptember 1. lesz!”

**2013 augusztus 30** Petres Sándor alelnök levele a megyei RMDSZ Frakciónak: Múlt szerdán délelőtt írtam alá a levelet, amiben “grafic de executie”-t kértünk a rosszul haladó önkormányzatoktól. A levél, számomra érthetetlen módon, csak csütörtökön lett elküldve, szerdán délután meg jött az általatok is megkapott dörgedelem. Az egyik csatolmányban a jelenlegi helyzet elemzése, illetve az eddig bejött óhajok szerepelnek, a másikban a nyári javaslat története.

**2013 szeptember 4** – Frakció és HET gyűlés Székelyudvarhelyen a PNDL-s átcsoportosított lista megbeszélésére, amit a Beruházási vezérigazgatóság elkészített a következő alapelvek mentén:

- ki van szerződve a tervezés és elkészült az érvényes terv, ellenőriztetve, stb.
- a kivitelezésre is van érvényes szerződés, sőt ha lehet már folyamatában van a munkálat
- a munkafelügyeletre (diriginte) is megvan a közbeszerzési eljárás és tudnak dolgozni

**2013 szeptember** – megbeszélés, elnöki kabinet, részt vettek: Borboly Csaba megyei tanácselnök és Petres Sándor alelnök:

Írjunk levelet a cégeknek, hogy lesz aszfaltozás és úgy tervezzék a munkát és az őszi anyagukat

- ez a levél nem lett megírva
- utólag volt megbeszélés a prefektussal és akkor derült ki, hogy a cégek nem akarják elvégezni a munkálatokat, mert nem tudják, nem voltak felkészítve

**2013 szeptember 10** Borboly Csaba megyei tanácselnök egyeztetése Iulian Matache fejlesztési államtitkárrel

**2013 szeptember 10** Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek és a Beruházási vezérigazgatóságon dolgozó kollégáknak: Sikerült az államtitkár úrral egyeztetni. Nagyjából kisebb korrekciókkal elfogadja amit akarunk.

“Én 13,30-ig vagyok. Addig kellene az Anexa 1 és 2-t megcsináljuk. Sürgösen! Mert ma már kiadta az ordinokat az államtitkár.”

**2013 szeptember 20** Bara Jolán (Beruházási vezérigazgatóság - utak) e-mailje: beruházási lista átcsoportosítás – beruházások, amik kivitelezhetőek ebben az évben és azok amikre nem látunk esélyt, hogy ebben az évben leszerződjük (1.908.000 lej)

**2013 szeptember 20** – Hargita Megye Tanács 16604/a/2013 számmal iktatott átírat a Minisztérium fele, mely tartalmazza a PNDL programlistára a javaslatot

**2013 szeptember 21** helyzetjelentés a 174A útról: a megyei tanácselnök várja hétfőn 15 óráig e-mailen, most már reálisan, mi a helyzet és mikor tudunk nekifogni! Legyen aktualizált ütemezési terv!

Bara Jolán kolléganő jelezte, hogy ha holnap lesz építkezési engedélyünk és felügyelet szerződésünk, akkor szerdán lehet munkafelület-átadás, illetve kezdési parancsot is tudunk adni. Menet közben készítjük az indítási papírokat.

**2013 szeptember 21** A megyei tanácselnök kérése a Beruházási vezérigazgatóság fele, hogy terjesszék elő a keddi tanácsülésre a beruházási lista módosítását a Gazdasági vezérigazgatósággal közösen (plusz akivel még kell!).

Az átcsoportosítás megtörtént, bár ennek lépései nem voltak elküldve a feladatkövető részlegnek. Az átcsoportosítást a tanácsülésen elfogadták.

**2013 szeptember 23** Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: költségvetés módosításhoz javaslataim és észrevételeim. Kérlek ahol lehetséges, vedd őket figyelembe, ha azokat megfelelőnek tartod.

**2013 szeptember 24, tanácsülés:** Egymillió dollárnyi összeget csoportosítottak át Hargita Megye Tanácsa költségvetésében a tanácsi testület szeptember 24-i, keddi soros ülésén, módosítva az idejű beruházási listán. Borboly Csaba elnök elmondása szerint az átirányított összegeket olyan beruházásokra fordítják, amelyeket még idén meg lehet valósítani, és azok a fejlesztések, amelyekről most átcsoportosítottak, nem maradnak befejezetlenül, hanem jövőre folytatják.

– Egy lej sem vész el a beruházásoknál – hangsúlyozta Borboly Csaba –, de azért volt szükség a költségvetés módosítására, mivel idén bizonyos munkálatokat már nem lehetett befejezni, ezért oda teszik a pénzt, ahol még év végéig hasznosan el lehet költeni a pénzt. A megyeelnök példaként említette, hogy a módosítás lehetővé teszi többek között az útépités folytatását Mindszent és Csíkszentgyörgy, a Peszente-tető és Énlaka, valamint Románandrásfalva és Kissolymos között.

**2013 szeptember 24** – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a szakigazgatóságnak: Köszönöm a gyors és hatékony munkát! Örövendve láttam ma szinte egyhangúlag lett elfogadva!

**2013 szeptember 27** - Tartottak munkamegbeszélést a 2013-as beruházási listáról. Ez alapján:

DJ 133 – Okt 7 – tervező közbeszerzés eredmény után eldől, hogy lesz-e idén munkálat

Ha nem lesz tervező a DJ 133-ra, akkor a PNDL pénzt átcsoportosítani a DJ 174A-ra (azzal a feltétellel hogy 2014-ben a DJ 133-ra visszakérüljön ez a pénz), itt a teljes 5,8 km befejezésére összesen szükség van kb. 2,5 millió lejre, ha odakerül a DJ 133-ról, akkor kell meg 1,2 millió lej. Felelős: Orbán Béla, Bara Jolán. Határidő: október 10.

**2013 október 1** – Megbeszélés a beruházási lista, PNDL lista, Harvíz közgyűlés, kaláka program és téli-nyári karbantartás ügyében. Ez alapján:

- Abban az esetben ha jó idő van a 123C út munkálatainak a befejezéséhez 2 napra, a 123B befejezéséhez 3-4 napra van szükség.
- A derzsi út (DJ133) egy húzos kemény hét lenne, Énlaka (136B) lényegesebben problémásabb.
- Bélbóri úton (174A) jelenleg dolgoznak, de 30 napja tudja hogy hosszabítás nem lesz.

Feladat: Írjunk levelet a Fundamenta cégnek, hogy 30 napon belül fejezzék be a utat.

A levél elkészült, a feladat így megoldottá lett nyilvánítva

Borboly Csaba: Október 7-én borítékbontás lesz és abban az esetben ha nem lesz komoly árajánlat, akkor aznap csoportosítsuk át a derzsi pénzt. Legyünk készen és menjen el 7.-én a levél a minisztériumba az újraosztásról.  
Felelős: Petres Sándor, Birtalan József

**2013 október 8** – Átirat a MDRAP-tól 3.765.000 lej kiegészítésről a PNDL-hez + Válaszátirat a minisztérium felé a 9.048.000 + 3.765.000 lej felosztásáról

**2013 október 23** – Megbeszélés emlékeztető - Ez alapján: 6 utas munkálat: 2 Fundamenta (174A, 153C), 4 Viaduct (133, 136B, 123C, 123B)

Petres Sándor: a minisztérium az idei költségvetés lezárásán dolgozik. Hargita megye 13%-os teljesítménnyel szerepel.

Fázisellenőrzések problémája – ISC – baj lehet a 174A-nál, de a 136B és a 133-as megyei útnál is. - segítséget kérünk a perfektustól, ne késleltesse az ISC a munkálatokat

**2013 október 25** – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 123B

**2013 október 25** – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 153C

**2013 október 25** – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 136B

**2013 október 25** – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 123C

**2013 október 25** – Szerződés felbontása HMT – MDRAP: DJ 128

**2013 november 15** – Petres Sándor alelnök átirata a Minisztérium fele – nr 22461/2013 – eddig a PNDL programon belől le lettek küldve a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi elszámolások. Úgy számoljuk, hogy 2013 november 20.-áig 3.215,73 ezer lej ellenértékére lesznek kivitelezve munkálatok.

**2013 november 18** – a Minisztérium átirata Hargita Megye Tanácsa fele (22523/18.11.2013) – a 99/30.10.2013-as sürgősségi kormányrendelettel le lettek csökkentve a 2013-as PNDL programra előirányozott pénzügyi források. Azok az elküldött elszámolások, amik még nem lettek megtérítve, 2014-es év elejére lesznek csak beütemezve.

**2013 november 19** – Petres Sándor alelnök levele a polgármestereknek, megyei tanács képviselőknek: csatolmányban a PNDL program Hargita megyére vonatkozó helyzetleírása, illetve az ebben a tárgyban a minisztériumhoz írt utolsó átiratunk és a minisztérium múlt hét végi levele.

A jelenlegi állás szerint, csak azon munkálatok ellenértékének részleges megtérítése várható idén, amelyek szeptember végéig lettek elvégezve (október elejei jelentés). A minisztérium mindenkivel pótszerződést akar kötni, amely szerint a többi kifizetés jövőben történik.

*Megj: Mellékelt táblázat az októberig elszámolt pénzekkel a PNDL programon belől – megyei tanács sajnos semmit nem számolt még el! + ami még kitűnik az az, hogy a települések esetén is a munkálatok költségeinek nagy része októberben lett elszámolva, ami a jelen helyzetben nagy problémákat okozhat és felmerül a kérdés, hogy azok a pénzek visszakérülnek-e az önkormányzathoz*

**2013 november 27** – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a polgármestereknek: a jövő hét folyamán, ahogy megkapom a szakigazgatóság részéről a részletes összesítést a PNDL-vel kapcsolatosan, szeretném ha tartanánk egy megbeszélést, melyen részt vennének az érintett polgármesterek és a kivitelező cégek képviselői is, hogy együtt találjuk meg azt a megoldást, amely minden érintett fél számára elfogadható.

**2013 december 3** – Bukarest, UNCJR (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România) gyűlés – ahol Tamás Sándor (Kovászna megye) és Borboly Csaba (Hargita megye) tanácselnökök jelenlétében Victor Ponta miniszterelnök és Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes a gyűlés napirendje mellett többek közt a PNDL program leblokkolt elszámolásaival kapcsolatos kérdésekre is sort kerítenek. A kormány előljárói elmondták, hogy a FMI-vel való tárgyalások után a tartalékalapból fognak folyósítani további összegeket az elmaradt számlák kifizetésére.

**2013 december 9** – Beruházási vezérigazgató:

Ebben az évben PNDL-re mennyi pénzt kaptunk megyei utas beruházásokra? - Finanszírozási szerződés megkötve októberben összesen 4.636,10 ezer lejre van.

- a. Ebből mennyit tudtunk elkölteni? - ebből nincsen dekontálva mert a PNDL-től közölték, hogy az idén már többet nem számolnak el.
- b. Mekkora a különbözet? - 4.636,10 ezer lej

**2013 december 11** – a Gazdasági vezérigazgatóságról jelzik az elnök úr fele, hogy az év elején kapott megyei utas TVA-s pénzekből kb 600.000 lejt nem fog tudni a megyei tanács elkölteni.

**2013 december 11** – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a megyei tanácsosok fele:

Mivel úgy néz ki, hogy még a TVA-s központi utas pénzeinkből is maradt meg olyan, amit nem tudunk december 20.-áig elkölteni, a pénteki rendkívüli tanácsülésen be szeretném vinni, hogy a megmaradt pénzeket adjuk oda azoknak a polgármesteri hivataloknak, akik a PNDL-s program miatt most bajba kerültek. Mivel ez utas TVA-s pénz, ezért csak utakra adhatjuk tovább.

A tegnapi álláspont és kimutatás alapján 600 ezer lejünk marad meg a megyei tanácsnál – ez közel nem elég arra, hogy megoldjuk a problémájukat, de legalább egy kicsit tudunk segíteni. Aszerint, hogy kinek mennyi elmaradása volt, az alábbi lenne a javaslat:

Várşag	30
Păuleni Ciuc	110
Gălăuţaş	30
Ciumani	100
Frumoasa	80
Sânmartin	40
Siculeni	60
Mugeni	100
Praid	50
<b>Total</b>	<b>600</b>

nagyjából 20% körül tudnánk adni annak az összegnek, amit elköltött a helyi tanács, de nem kapott vissza.



A tanácsok, rövidezne kell hozzánk döntéseket, hogy költség ők el 20-ig! és tudjuk elsámzolni!  
Ha nincs kifogás, akkor holnap jó lenne már jelezzük a tanácsoknak, hogy tudjanak dolgozni ők is vele.  
Kérdésem tehát ez rendben? Mehet?

**2013 december 13 – Hargita Megye Tanácsa – rendkívüli tanácsülés: Nehéz helyzetben lévő településeknek utalt ki pénzt a megyei tanács rendkívüli ülésén**

Hargita Megye Tanácsa rendkívüli ülést tartott december 13-án, pénteken a csíkszeredai megyeházán. A sürgősségnek az adott okot, hogy vannak olyan költségvetési pénzek, amelyeket nem tudtak elkölteni. Az országos költségvetésből Hargita megye 9,1 millió lej kapott utakra, ebből az összegből 600 000 lej megmaradt, amit a nagyobb adóssággal rendelkező településeknek osztották ki – indokolta a rendkívüli ülés összehívásának fontosságát Borboly Csaba megyeelnök.

A megyei tanács a most kiutalt összeggel a községi utak költségeihez járul hozzá, így nem kell visszaadni az el nem használt pénzt a központi költségvetésbe. A testület döntése értelmében Gyergyócsomafalva 100 000 lej, Csíkszépvíz 80 000 lej, Galócás 30 000 lej, Bögöz 100 000 lej, Csíkpálfalva 110 000 lej, Parajd 50 000 lej, Csíkszentmárton 40 000 lej, Madéfalva 60 000 lej, Varság pedig 30 000 lej kapott adósságok törlesztésére.

**2013 december 23: Beruházási vezérigazgatóság levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek – téma: a December 3.-án Ponta miniszterelnök és Dragnea miniszterelnök-helyettes által beígért PNDL-s pénzek – a megyei tanács hogy kíván ezzel bánni:**

“D-na Mihaela Rogoz-tól származó telefon értesülés szerint:

A kormány tartalék alapján az eddig elvégzett/elszámolt 4.700.000 lej körüli érték 58%-a lesz átutalva/kifizetve. Az 58 % az egész értékre és minden egyes munkálatra is érvényes.

Péntek (dec 20) 15 órakor még nem kapta meg ezt az összeget mindenik település, tehát az átutalások még folyamatban vannak.

Szintén péntektől vannak félinformációk, hogy egyes munkálatokra talán még adnak az 58 % fölött is valamennyit.

Ezt erősítette meg, ugyanilyen homályosan a fenti hölgy ma 8,50 órakor.”

**+ a fenti levélhez további pontosítás a vezérigazgatóság részéről:**

csatolva a pontos táblázat az összegekkel, amik a múlt héten már át lettek utalva a polgármesteri hivataloknak (az el nem számolt pénzek 58%-a ), illetve a további várható összegek (bár nem hivatalosan, de közölték a minisztériumtól, hogy a maradék tartozás, tehát a maradék 42%-nak várhatóan még idén átutalják az 59%-át)

**III. Következtetések:**

Nehézséget jelentett, hogy nem volt egy pontos, megalapozott javaslat leküldve a MDRAP-hoz, pedig már a 2013 márciusi bukaresti UNCJR gyűlés után tudott volt, hogy milyen kritériumok alapján kell a listát összeállítani és kb mennyi pénzre lehet számítani. Bár az év elején a megyei egyeztető tanáccsal való levelezésben valóban 20 milliós listáról volt szó, azonban már ott meg van említve, hogy a reális összeg kb 11-13 millió lej lesz. Ennek ellenére csak egy 20 milliós javaslat lett elkészítve és így olyan többek között olyan megyei utas beruházások is

felkerültek a listára, amiről utólag kiderült, hogy vagy teljesen lehetetlen idén megvalósítani (pl. DJ128), vagy komoly nehézségek és hátráltató tényezők lépnek fel a megvalósítás során (pl. DJ133).

A települések esetében megtett júniusi javaslatoknál is, egyes esetekben elmondható, hogy felületes volt, hisz több olyan munkálat is megfogalmazásra került amelyeket nem lehetett megvalósítani.

A fentiek alapján került elkészítésre a szeptemberi új PNDL lista, mely amennyire lehetett helyrerakta a dolgokat, de sajnos későre, mert a kormány az október 30.-ai 99-es sürgősségi rendelet értelmében lecsökkentette az erre a programra kiutalt pénzeket. Egy másik nehézség, ugyancsak itt, az volt, hogy kb. egy hét állt volna rendelkezésre újabb pénzek elköltésére, de mivel még az arra tett javaslatokban nem volt már kivitelezés alatt levő munkálat, az újabb 3,7 millió lejes összeget sem lehetett felhasználni pár nap alatt - habár erre lett volna lehetőség, ahogy megtették esetenként más megyék.


A november 19.-ei polgármestereknek kiküldött összesítő alapján látszik, hogy az októberig elszámolt pénzekkel a PNDL programon belől megyei tanács sajnos semmit nem számolt még el! Ez sajnos így is maradt: a programba befogott munkálatoknál még egyetlen kifizetést sem tudott a megyei tanács eszközölni!

Kérdések, amik felmerülnek a megyei utakkal kapcsolatban a kronológia során:

- Június és augusztus közötti időszakban miért nem lettek a javasolt megyei utakkal kapcsolatban a problémák kitisztázva és az eljárások, munkálatok elindítva?
- A 133-as út esetében, ahogy kiderült, hogy gond van a tervvel, miért nem lett azonnal az új tervezésre kiírva a közbeszerzési eljárás? Miért vártak ezzel augusztus utánig?
- a 174A esetében miért nem lettek elindítva a munkálatok idejében, még a nyáron? az egyetlen javasolt megyei út, amelynél elméletileg semmilyen akadály nem állt fenn.
- miért nem történt meg az átcsoportosítás már hamarabb, a nyár folyamán, mikor kiderült, hogy vannak olyan megyei utas munkálatok a listán, amit egyértelműen nem lehet kivitelezni? közben meg ott voltak a 123B és C megyei utak, amiknél lehetett volna már hamarabb is indítani a munkálatokat

Amennyiben ezek a fenti problémákra vonatkozó kérdések nem merültek volna fel és a munkálatok elindítása már júliusban elkezdődött volna, a megyei tanács most nem lenne ekkora veszteségnek kitéve. Tehát ha a nyár folyamán indul el a program megyei utas része és nem szeptembertől, akkor a megyei tanács nem veszített volna el közel 1 millió eurót a megyei utaknál!

Ezzel szemben, a településeknél kiténik, hogy a kezdeti pontatlan lista és kavarodások ellenére is a polgármesteri hivatalok ügyesen és gyorsan mozogtak és október végéig sikerült a betervezett összeg 86%-ára beküldjék az elszámolásokat a Minisztériumba!

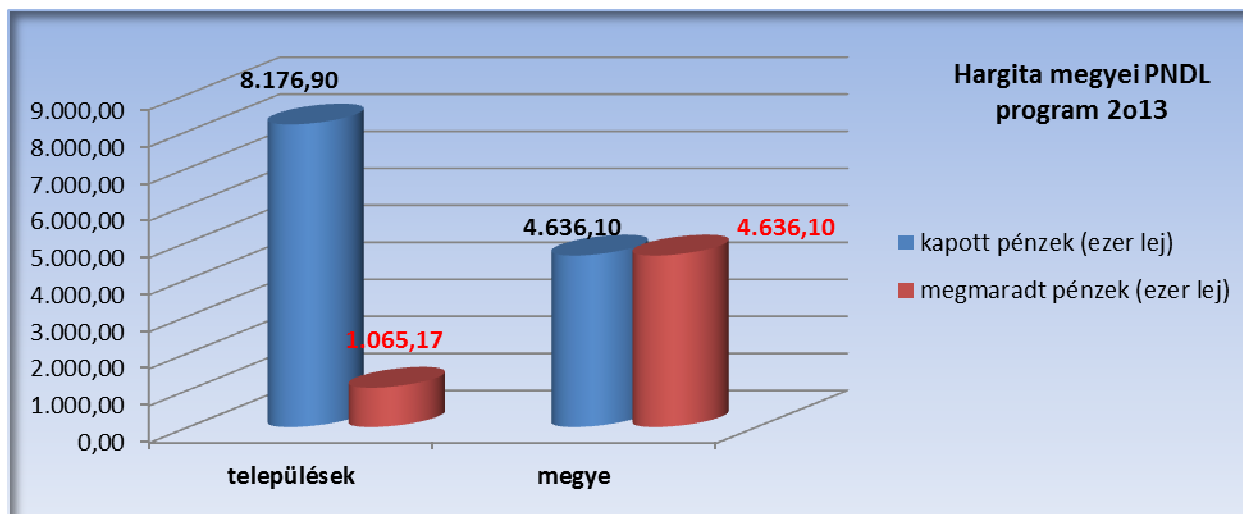

Kimutatás, hogy milyen hatékonyan sikerült a 2013-as PNDL programot megvalósítani a települési beruházásoknál, illetve a megyei beruházásoknál

#### IV. Javaslatok:

A fenti összeállítás alapján indokoltnak látszik az alaposabb munka, jobb koordinálás. Mikor kormányzati pénzek lehívására való javaslattevétről van szó, érdemes lenne a körültekintőbb előkészítése a dokumentációknak. A Helyi beruházások részlegben dolgozó kollégák, a területi irodák munkatársai segítségével jobban körbe kellene járják a javasolt listába felkerülő munkálatokat, azok aktuális állapotát, a szükséges finanszírozást, leellenőrizni minden számot és minden olyan tényezőt ami a későbbiekben befolyásolhatja a kivitelezés menetét.

A jövőre való tekintettel, javasolt lenne már év elején, január 15.-ig egy arra az évre vonatkozó PNDL lista elkészítése az illetékes alelnök koordinálásával. Most a 2014-es évet figyelembe véve nagyon fontos lenne, hogy sürgősen elkészüljön a fent említett lista, hogy első között lehessen folytatni, illetve befolyezni a más elkezdett munkálatokat.

Mindezt megelőzően azonban szükséges előzetesen tisztázni minden tervet, engedélyt, stb, hogy többé ne állhasson elő az idei évhez hasonló eset, mely összességében közel 2 millió eurós veszteséget okozott a megyének!

## Eljárás

<b>Cím</b>	Országos Településfejlesztési Program (PNDL) Hargita megyében - 2013
<b>Hivatkozás:</b>	A rendelkezésre álló, SEAP honlapon közzétett kimutatások. A minisztérium által küldött átiratok A témában folytatott levelezések A szakigazgatóságok által összeállított kimutatások A megyei tanács által elfogadott tanácshatározatok
<b>Jogi alap:</b>	-
<b>HMT határozat/elnöki rendelet száma és kelte:</b>	-
<b>Illetékes struktúra:</b>	Menedzsment vezérigazgatóság Feladatkövető részlege Elnöki kabinet
<b>Végleges jelentés kelte:</b>	2013. december 23.
<b>Korábbi jelentések a témában:</b>	–
<b>A témában folytatott konzultáció :</b>	a jeletés kezdetleges formája ki volt közölve az illetékes alelnöknek és vezérigazgatóságoknak – nem érkezett visszajelzés
